

災害復旧・インフラ強靱化事業の進捗状況

平成30年7月豪雨災害により被害を受けた地域の復旧工事・インフラ強靱化事業の進捗状況です。
今後も本復旧の早期完了や再度災害防止に取り組んで参ります。

建設課 ☎823-9209 ☎823-9203

- ★ 確認・調査中
- ★★ 応急復旧着手
- ★★★ 応急復旧完了
- ★★★★ 本復旧着手



⑫【奥之谷川】★★★★
えん堤本体工事については、3月に着手し、今年度末に完了する予定です。
(進捗率10%未満)



①【町道202線】完了
6月中旬に完了しました。





②【楠木谷川】★★★
えん堤本体工事については、7月に受注者が決定しました。



③【東唐谷川】★★★
5月末に強靱ネットの設置が完了しました。現在、対策の内容を検討しています。



⑪【瀬野川左岸】★★★★
3月に本復旧に向けた工事に着手し、今年度末に完了する予定です。(進捗率59%)

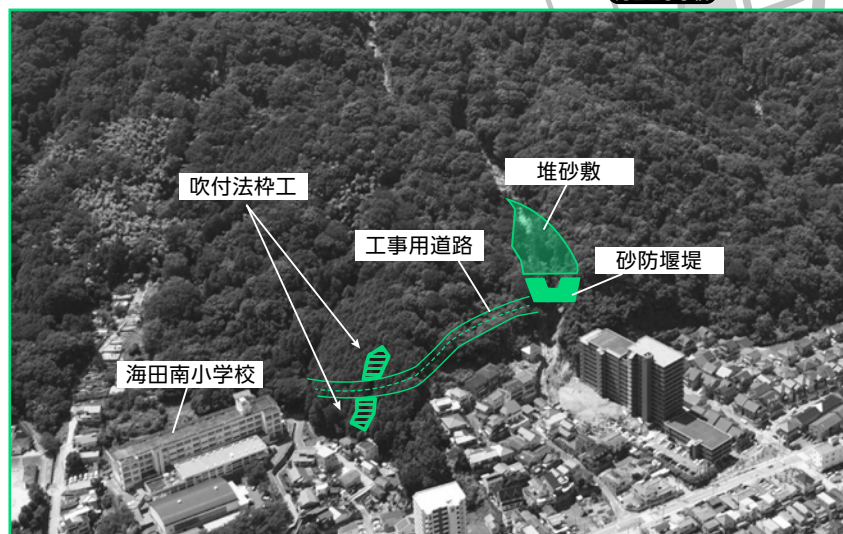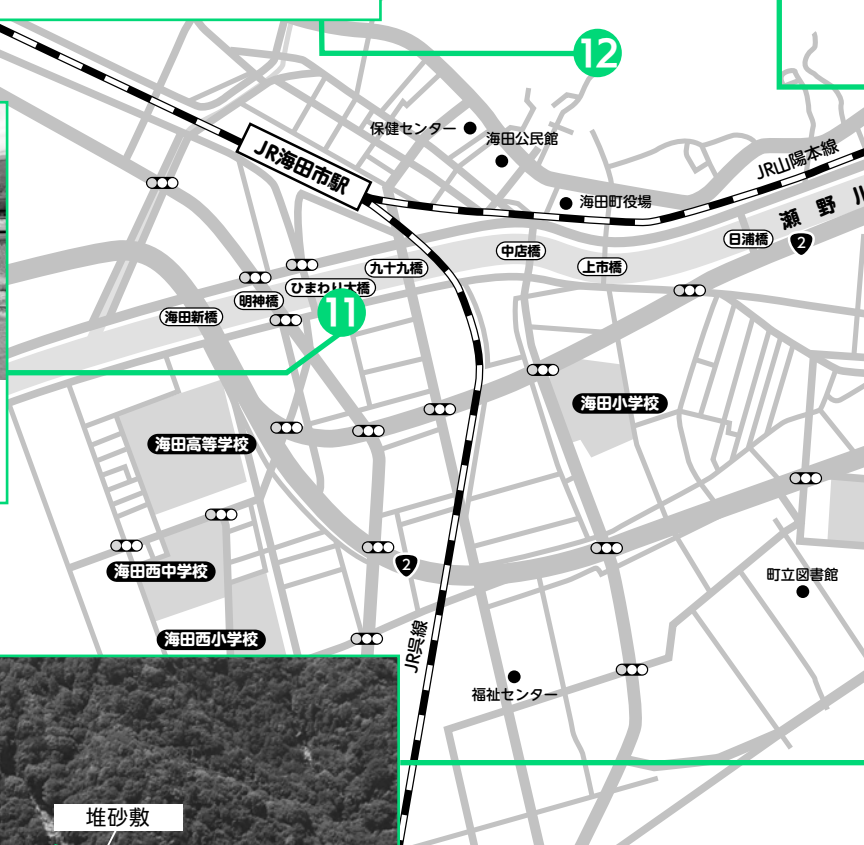

⑩【南幸川・南幸町】★★★
5月にえん堤本体工事と急傾斜地崩壊対策工事の受注者が決定しました。今年度末に完了する予定です。(進捗率10%未満)




⑨【明飛川】★★★★
明飛川沿いの町道304号線の復旧工事は、6月に工事着工し、9月末の完了予定です。また、現在、えん堤整備に向けて、調査業務を実施中です。




④【唐谷川】★★★★
道路・護岸の工事については、5月に着手し、2カ年で工事を行う予定です。(進捗率10%未満)





⑥【三迫川左支川】★★★★
えん堤に堆積した土砂の撤去については、今年度中に完了を予定しています。護岸工事については、6月に受注者が決定しました。今後、2カ年で工事を行う予定です。




⑬【瀬野川】★★★★
災害で堆積した土砂の半分程度の浚せつが完了しました。また、今年の冬頃に再度、土砂の浚せつを行う予定です。




⑤【三迫川】★★★★
道路・護岸の工事については、6月に受注者が決定しました。今後、2カ年で工事を行う予定です。



⑧【西ノ谷川】★★★
道路・護岸の工事については、5月末、7月下旬と二度入札を行いました。いずれも不調となりました。現在、再入札の準備をしています。また、えん堤整備に向けては、調査業務を実施中です。



⑦【西ノ谷川支川】★★★
道路・護岸の工事については、5月末、7月下旬と二度入札を行いました。いずれも不調となりました。現在、再入札の準備をしています。また、えん堤整備に向けては、調査業務を実施中です。



【串掛林道】★★★★
【串掛林道】墓苑までの区間については、通行可能となりました。墓苑から広島市行政界までの区間については6月に受注者が決定しました。今年末に完了する予定です。
