

災害復旧・インフラ強靱化事業の進捗状況

平成30年7月豪雨災害により被害を受けた地域の復旧工事・インフラ強靱化事業の進捗状況です。
今後も本復旧の早期完了や再度災害防止に取り組んで参ります。

建設課 ☎823-9209 ☎823-9203

平成30年12月末 現在情報

- ★ 確認・調査中
- ★★ 応急復旧着手
- ★★★ 応急復旧完了
- ★★★★ 本復旧着手



⑫【奥之谷川】★★★★

著しく流れを阻害する土砂の撤去が完了しました。えん堤本体工事については、今年度内に着工し、来年6月に完成する予定です。



①【町道2号線】★★★★

今年1月に本復旧に向けた工事に着手し、6月には完成予定です。



②【楠木谷川】★★

土砂の撤去、強靱ネットの設置が完了しました。えん堤本体工事については、今年度内に発注する予定です。




③【東唐谷川】★★

今年度末に強靱ネット設置と土砂撤去が完了する予定です。



⑪【瀬野川左岸】★★★★

今年度内に本復旧に向けた工事に着手し、来年度末完成をめざして取り組みます。

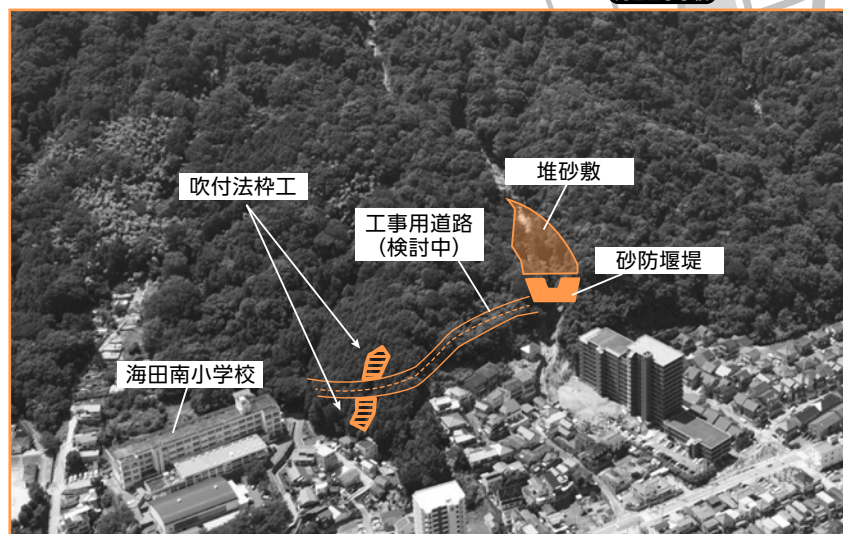

⑩【南幸川・南幸町】★★★★

今年度末にえん堤本体工事と急傾斜地崩壊対策工事を発注する予定です。来年度末に完成予定となっています。



⑨【明飛川】★★★★

土砂の撤去、大型土のうの設置が完了しました。本復旧の対策内容については、現在検討中です。



④【唐谷川】★★★★

著しく流れを阻害する土砂の撤去が完了しました。道路・護岸の工事については、今年度末に着工し、2カ年で工事を行う予定です。



⑥【三迫川左支川】★★★★

土砂の撤去が完了しました。えん堤土砂の撤去については来年度に完成を予定しており、護岸工事については来年度から2カ年で工事を行う予定です。

⑤【三迫川】★★★★

著しく流れを阻害する土砂の撤去が完了しました。道路・護岸の工事については、来年度から2カ年で工事を行う予定です。

⑬【瀬野川】★★★★★

5月末に土砂の浚せつ完了する予定です。

⑧【西ノ谷川】★★★★

土砂の撤去が完了しました。道路・護岸の工事については、来年度から2カ年で工事を行う予定です。

⑦【西ノ谷川支川】★★★★

土砂・流木などの撤去が完了しました。道路・護岸の工事については、来年度から2カ年で工事を行う予定です。

【串掛林道】★

現在通行止めを行っています。今年度末に墓苑までの工事に着工し、来年度に墓苑から頂上までの工事に着工します。
