


災害復旧・インフラ強靱化事業の進捗状況

建設課 ☎823-9209 ㊚823-9203

平成30年7月豪雨災害により被害を受けた地域の復旧工事・インフラ強靱化事業の進捗状況です。
今後も本復旧の早期完了や再度災害防止に取り組んで参ります。

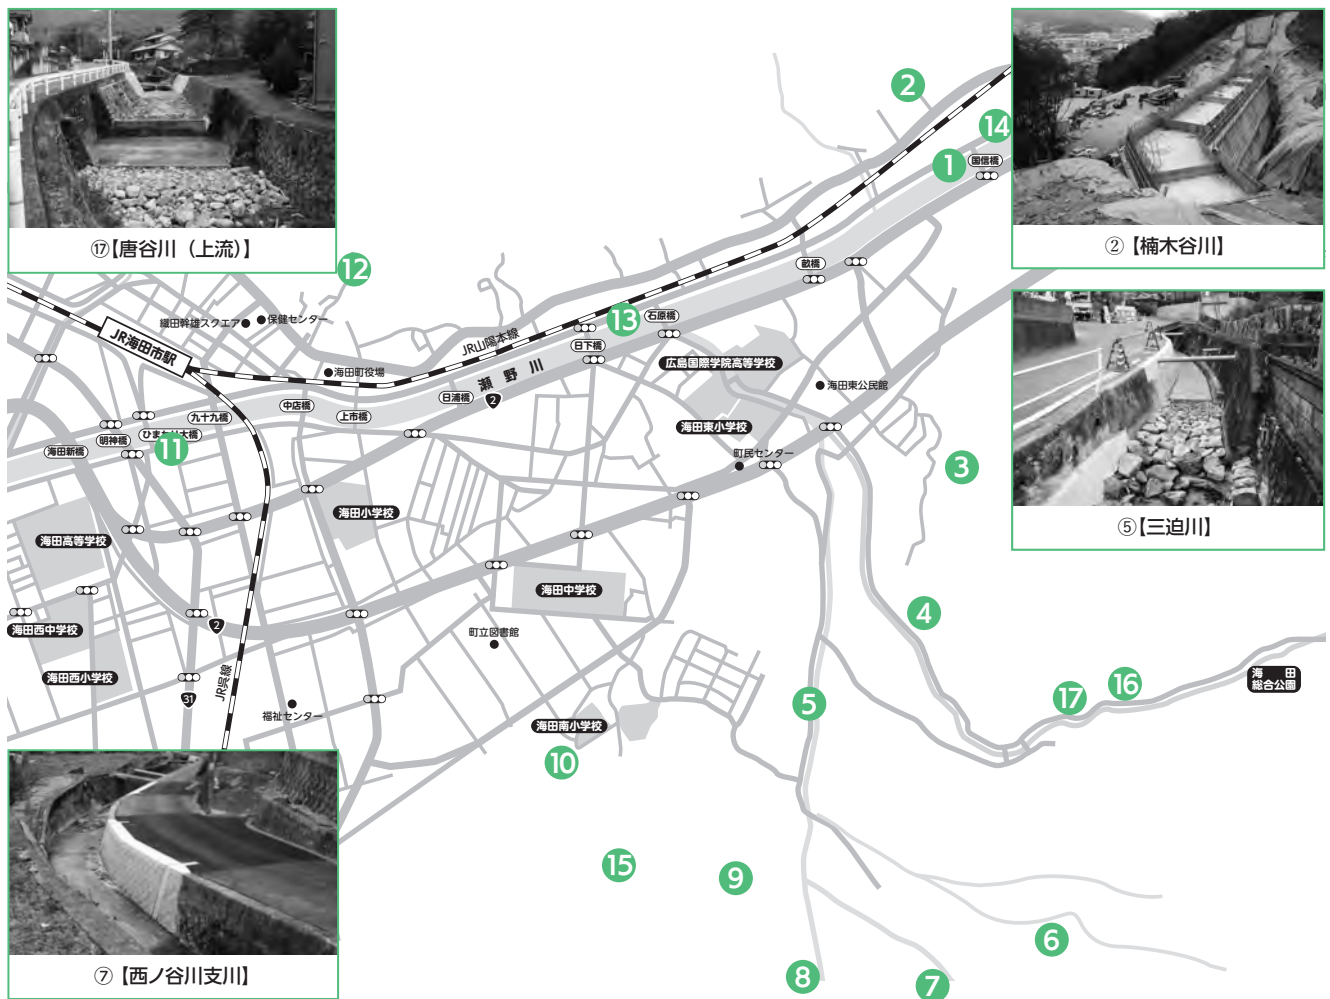

箇所番号	箇所名	事業者	進捗率	完了予定	コメント
①	町道2号線	町	100%	完了	
②	楠木谷川	県	30%	R3年度	
③	東唐谷川	県		—	今年度、事業に着手する予定です。
④	唐谷川（下流）	県・町	100%	完了	
⑤	三迫川	県・町	30%	R3年度	
⑥	三迫川左支川	県	25%	R3年度	
⑦	西ノ谷川支川	県・町	50%	R3年度	砂防えん堤整備に向けて、調査業務を実施中です。
⑧	西ノ谷川	県・町	90%	今年度	砂防えん堤整備に向けて、調査業務を実施中です。
⑨	明飛川	町	100%	完了	砂防えん堤整備に向けて、調査業務を実施中です。
⑩	南幸川・南幸町	県	85%	今年度	
⑪	瀬野川左岸	県	100%	完了	
⑫	奥之谷川	県	100%	完了	
⑬	瀬野川	県	100%	完了	石原橋付近の護岸の復旧が含まれています。
⑭	瀬野川	県	10%	今年度	国信橋から上流側の土砂を撤去します。
⑮	串掛林道	町	100%	完了	
⑯	栃木橋	町	50%	R3年度	
⑰	唐谷川（上流）	県・町	80%	今年度	

※12月末時点
