


04 災害復旧事業の進捗状況

●建設課(役場2階) ☎823-9209 FAX.823-9203

平成30年7月豪雨災害により被害を受けた地域の復旧事業の進捗状況です。
今後も本復旧の早期完了に取り組みます。

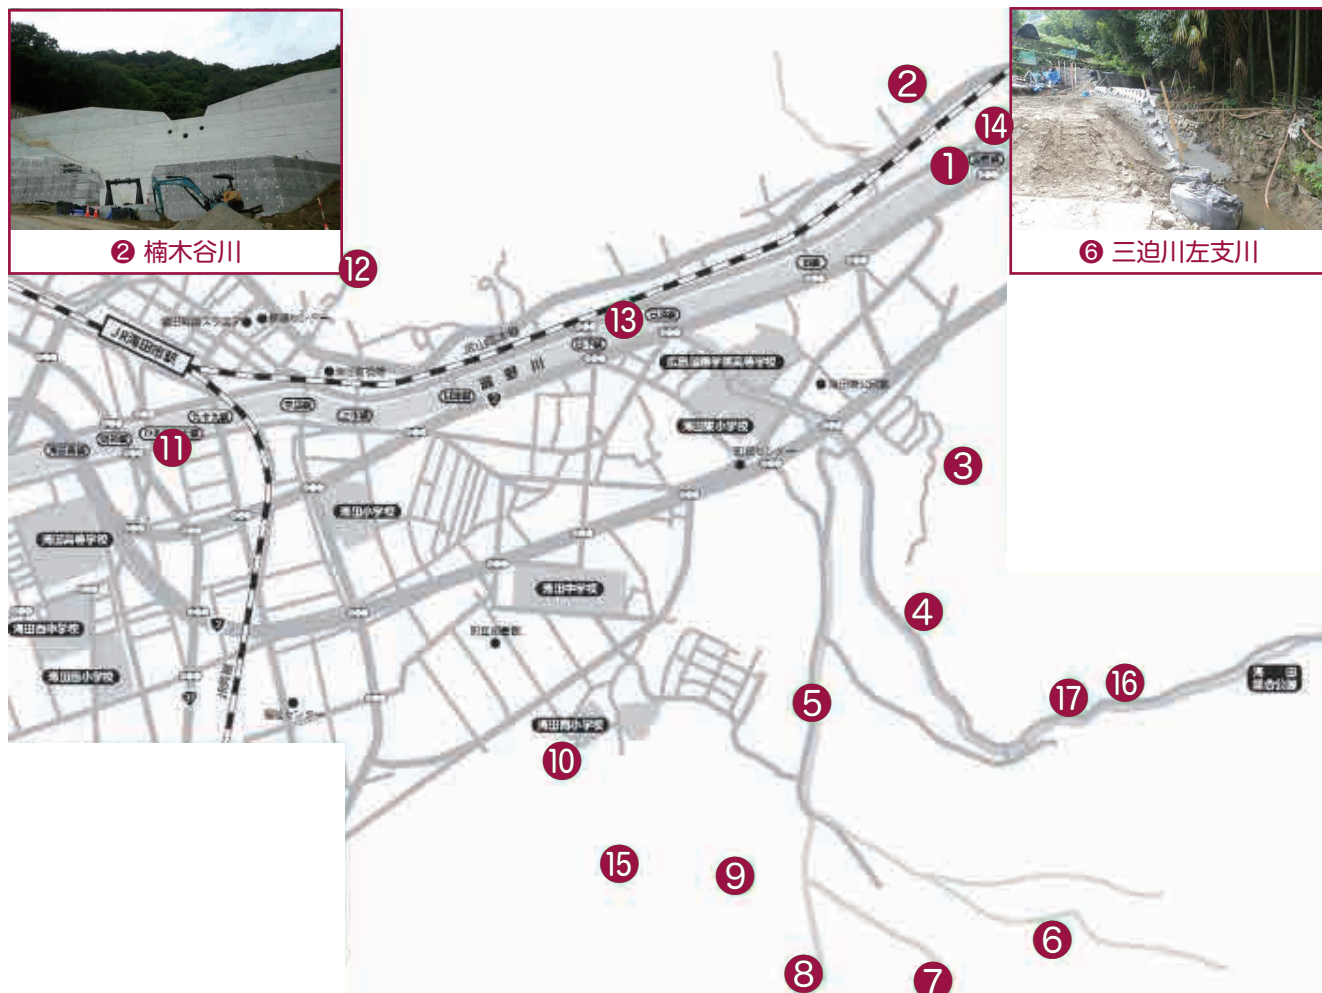

箇所番号	箇所名	事業者	進捗率 50%	完了予定	コメント
①	町道2号線	町	100%	完了	
②	楠木谷川	県	80%	R4年度	
③	東唐谷川	県	100%	完了	
④	唐谷川(下流)	県・町	100%	完了	
⑤	三迫川	県・町	83%	R4年度	
⑥	三迫川左支川	県	80%	R4年度	
⑦	西ノ谷川支川	県・町	100%	完了	
⑧	西ノ谷川	県・町	100%	完了	砂防えん堤整備に向けて、調査業務を実施中です。
⑨	明飛川	町	100%	完了	砂防えん堤整備に向けて、調査業務を実施中です。
⑩	南幸川・南幸町	県	100%	完了	
⑪	瀬野川左岸	県	100%	完了	
⑫	奥之谷川	県	100%	完了	
⑬	瀬野川	県	100%	完了	石原橋付近の護岸の復旧が含まれています。
⑭	瀬野川	県	100%	完了	国信橋から上流側の土砂を撤去しました。
⑮	串掛林道	町	100%	完了	
⑯	栃木橋	町	100%	完了	
⑰	唐谷川(上流)	県・町	100%	完了	

※国の補助金を活用した災害復旧工事について記載しています。(町施工分については完了しています)

※6月末時点
