


## 05 災害復旧事業の進捗状況

●建設課(役場2階) ☎823-9209 FAX.823-9203

平成30年7月豪雨災害により被害を受けた地域の復旧事業の進捗状況です。  
今後も本復旧の早期完了に取り組みます。

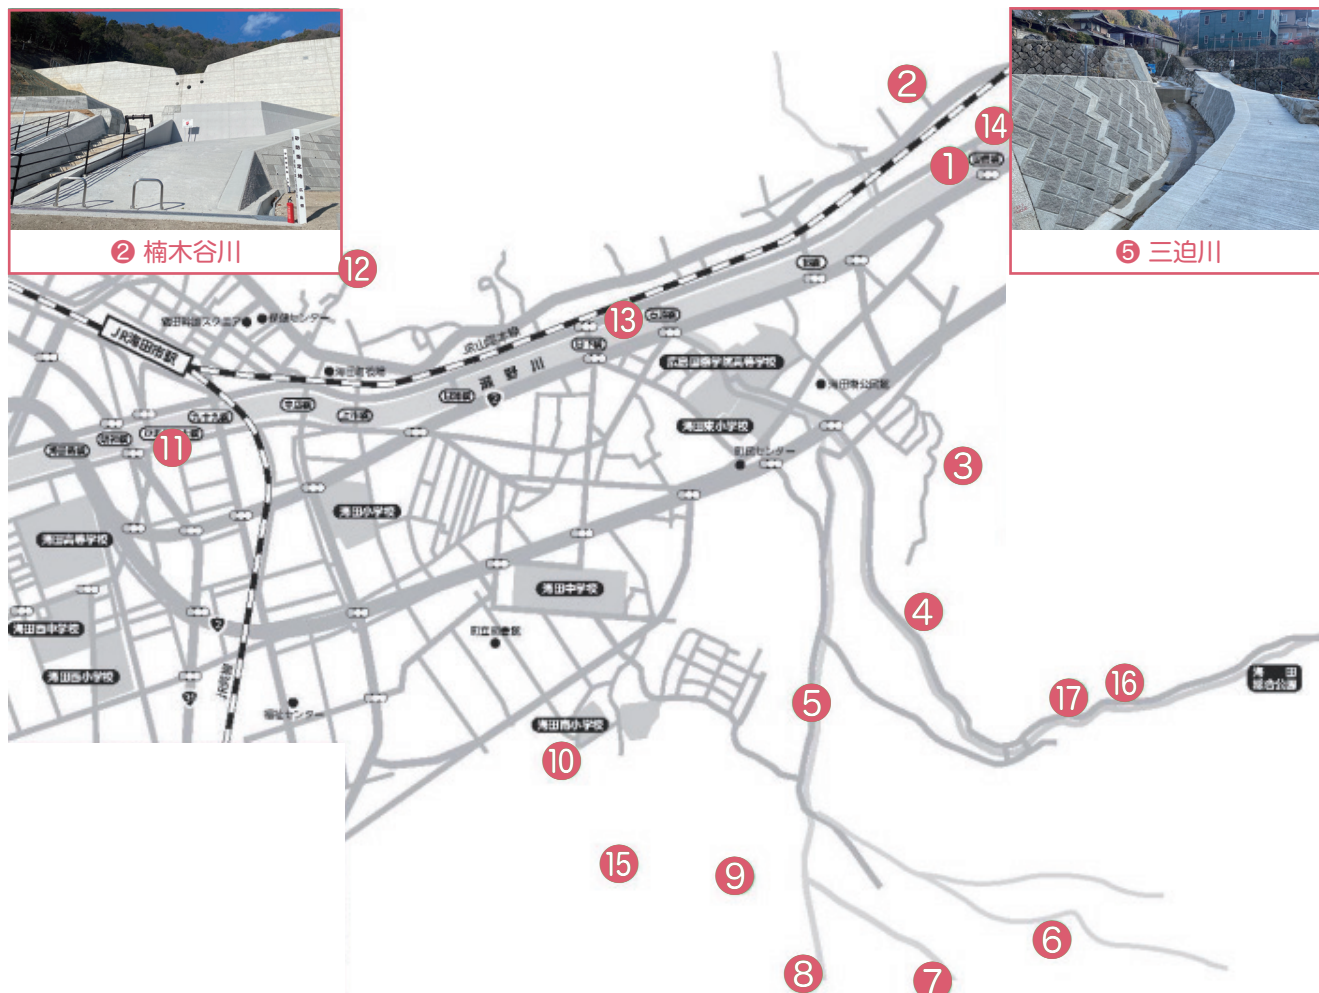

| 箇所番号 | 箇所名     | 事業者 | 進捗率         | 完了予定 | コメント                    |
|------|---------|-----|-------------|------|-------------------------|
|      |         |     | 0% 50% 100% |      |                         |
| ①    | 町道2号線   | 町   | 100%        | 完了   |                         |
| ②    | 楠木谷川    | 県   | 88%         | R4年度 |                         |
| ③    | 東唐谷川    | 県   | 100%        | 完了   |                         |
| ④    | 唐谷川(下流) | 県・町 | 100%        | 完了   |                         |
| ⑤    | 三迫川     | 県・町 | 95%         | R4年度 |                         |
| ⑥    | 三迫川左支川  | 県   | 95%         | R4年度 |                         |
| ⑦    | 西ノ谷川支川  | 県・町 | 100%        | 完了   |                         |
| ⑧    | 西ノ谷川    | 県・町 | 100%        | 完了   | 砂防えん堤整備に向けて、調査業務を実施中です。 |
| ⑨    | 明飛川     | 町   | 100%        | 完了   | 砂防えん堤整備に向けて、調査業務を実施中です。 |
| ⑩    | 南幸川・南幸町 | 県   | 100%        | 完了   |                         |
| ⑪    | 瀬野川左岸   | 県   | 100%        | 完了   |                         |
| ⑫    | 奥之谷川    | 県   | 100%        | 完了   |                         |
| ⑬    | 瀬野川     | 県   | 100%        | 完了   | 石原橋付近の護岸の復旧が含まれています。    |
| ⑭    | 瀬野川     | 県   | 100%        | 完了   | 国信橋から上流側の土砂を撤去しました。     |
| ⑮    | 串掛林道    | 町   | 100%        | 完了   |                         |
| ⑯    | 栃木橋     | 町   | 100%        | 完了   |                         |
| ⑰    | 唐谷川(上流) | 県・町 | 100%        | 完了   |                         |

※国の補助金を活用した災害復旧工事について記載しています。(町施工分については完了しています)

※12月末時点
