


災害復旧・インフラ強靱化事業の進捗状況

建設課 ☎823-9209 FAX 823-9203

平成30年7月豪雨災害により被害を受けた地域の復旧工事・インフラ強靱化事業の進捗状況です。
今後も本復旧の早期完了や再度災害防止に取り組んで参ります。

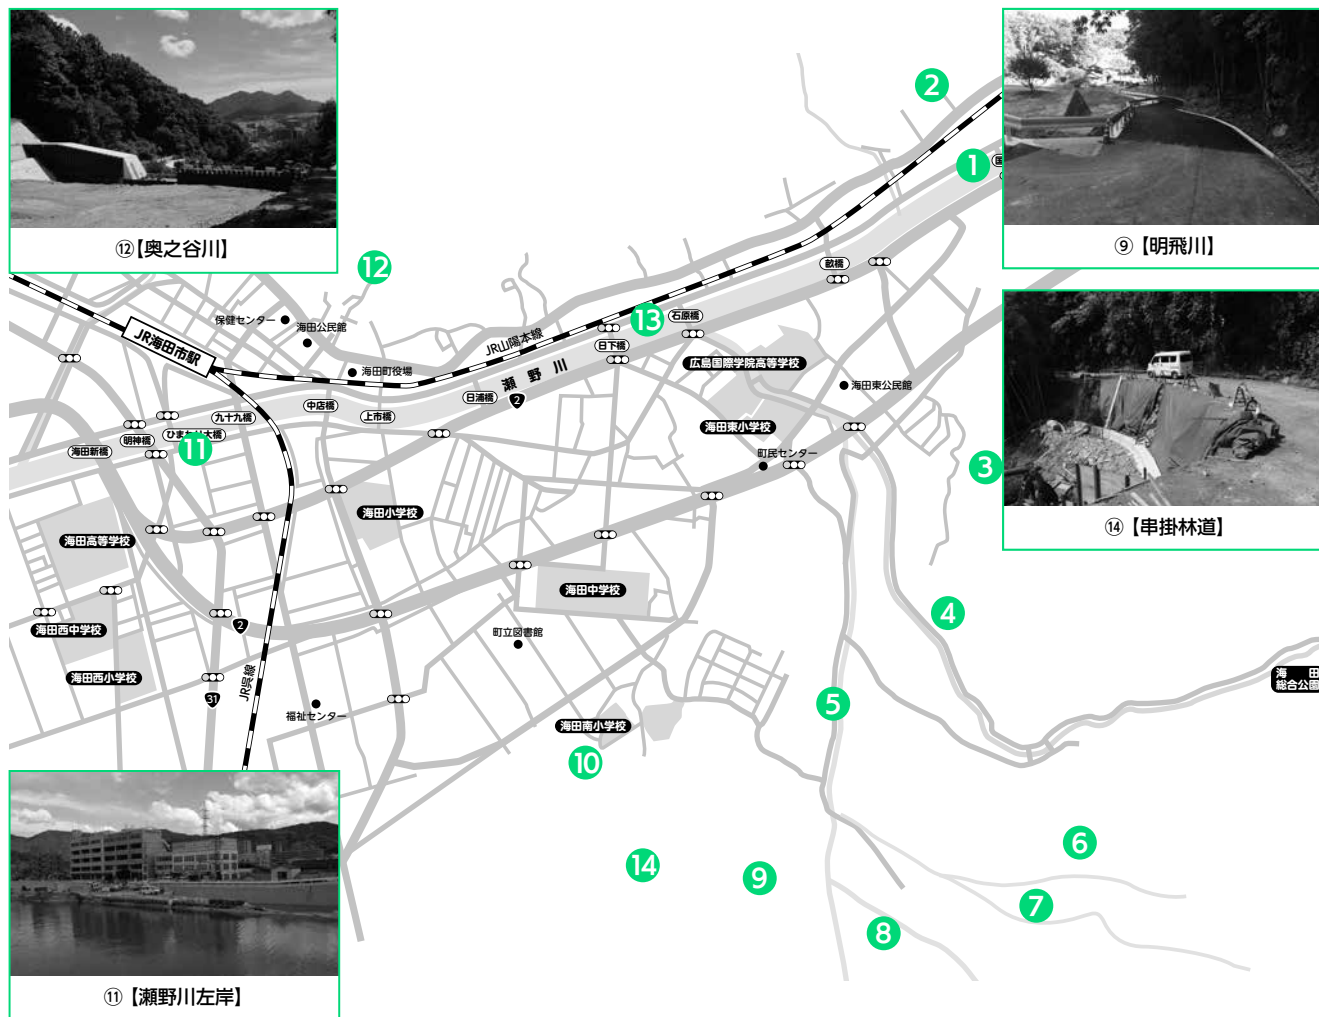

箇所番号	箇所名	進捗率	完了予定	コメント
①	町道2号線	完了	—	災害復旧工事は6月中旬に完了しました。 今年の秋頃から、河川敷に降りるためのスロープを整備する予定です。
②	楠木谷川	10%未満	今年度末	7月に受注者が決定しました。10月からの工事着手予定です。
③	東唐谷川	設計中	今年度末	5月末に応急対策は完了しました。現在、対策内容を検討しています。
④	唐谷川	10%未満	来年度末	10月に工事説明会を開催する予定です。
⑤	三迫川	10%未満	来年度末	10月に工事説明会を開催する予定です。
⑥	三迫川左支川	10%未満	来年度末	10月に工事説明会を開催する予定です。
⑦	西ノ谷川支川	未着手		9月中旬に再入札予定です。また、砂防えん堤整備に向けて、調査業務を実施中です。
⑧	西ノ谷川	未着手		業者選定に向け準備中です。また、砂防えん堤整備に向けて、調査業務を実施中です。
⑨	明飛川	完了	—	明飛川沿いの町道304号線の災害復旧工事は令和元年9月に完了しました。 現在、砂防えん堤整備に向けて、調査業務を実施中です。
⑩	南幸川・南幸町	10%未満	今年度末	7月27日に工事説明会を開催し、工事に着手しました。
⑪	瀬野川左岸	95%	10月末	10月末に完了する見込みです。
⑫	奥之谷川	42%	今年度末	砂防えん堤本体は、今年度末完了予定です。
⑬	瀬野川	—	—	災害で堆積した土砂の半分程度を6月末までに浚せつしました。 今年の冬頃に再度、土砂の浚せつを行う予定です。
⑭	串掛林道	23%	12月末	三迫の入口から墓苑までの区間は通行可能となりました。 墓苑から広島市行政界までの区間は工事中です。
