


災害復旧・インフラ強靱化事業の進捗状況

建設課 ☎823-9209 ☎823-9203

平成30年7月豪雨災害により被害を受けた地域の復旧工事・インフラ強靱化事業の進捗状況です。
今後も本復旧の早期完了や再度災害防止に取り組んで参ります。

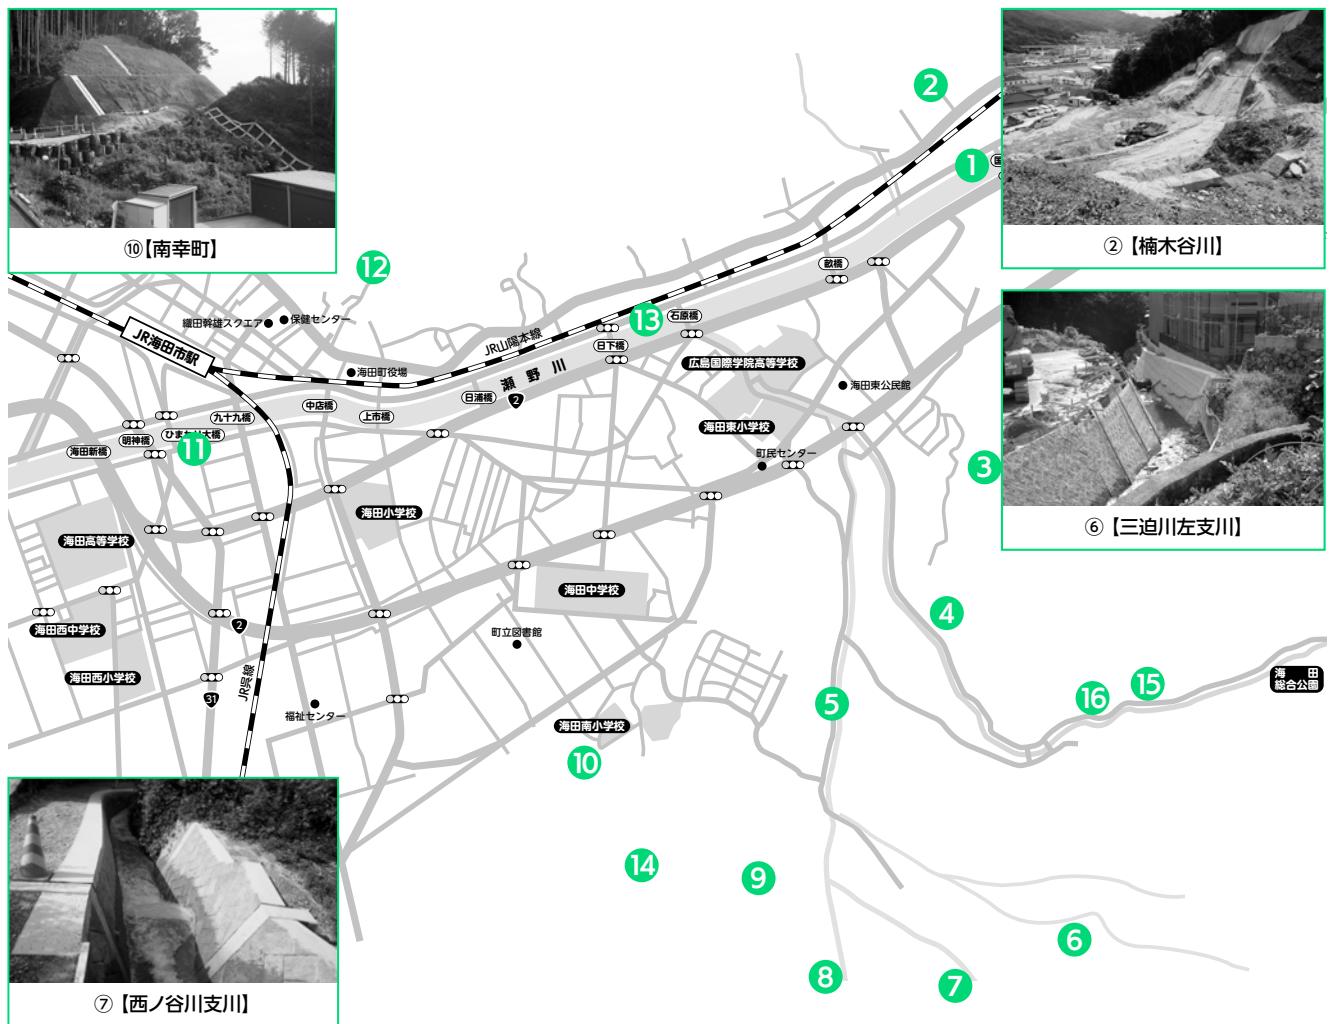

箇所番号	箇所名	進捗率	完了予定	コメント
①	町道2号線	100%	完了	
②	楠木谷川	10%未満	今年度	
③	東唐谷川		—	今年度、事業に着手する予定です。
④	唐谷川（下流）	100%	完了	
⑤	三迫川	30%	今年度	
⑥	三迫川左支川	25%	今年度	
⑦	西ノ谷川支川	40%	今年度	砂防えん堤整備に向けて、調査業務を実施中です。
⑧	西ノ谷川	20%	今年度	砂防えん堤整備に向けて、調査業務を実施中です。
⑨	明飛川	100%	完了	砂防えん堤整備に向けて、調査業務を実施中です。
⑩	南幸川・南幸町	35%未満	今年度	
⑪	瀬野川左岸	100%	完了	
⑫	奥之谷川	100%	完了	
⑬	瀬野川	50%	9月末	
⑭	串掛林道	100%	完了	
⑮	栃木橋	20%	今年度	
⑯	唐谷川（上流）	15%未満	今年度	

※6月末時点
