

災害復旧・インフラ強靱化事業の進捗状況

平成30年7月豪雨災害により被害を受けた地域の復旧工事・インフラ強靱化事業の進捗状況です。
今後も本復旧の早期完了や再度災害防止に取り組んで参ります。

建設課 ☎823-9209 ☎823-9203


- ★ 確認・調査中
- ★★ 応急復旧着手
- ★★★ 応急復旧完了
- ★★★★ 本復旧着手



⑫【奥之谷川】★★★★
えん堤本体工事については、3月に着手し、今年度末に完了する予定です。



①【町道2号線】★★★★
今年1月に本復旧に向けた工事に着手し、6月に完了する予定です。

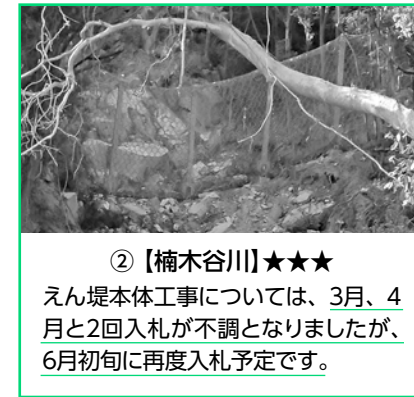


②【楠木谷川】★★★★
えん堤本体工事については、3月、4月と2回入札が不調となりましたが、6月初旬に再度入札予定です。



③【東唐谷川】★★★★
5月末に強靱ネットの設置と土砂の撤去が完了しました。



⑪【瀬野川左岸】★★★★
3月に本復旧に向けた工事に着手し、今年度末に完了する予定です。

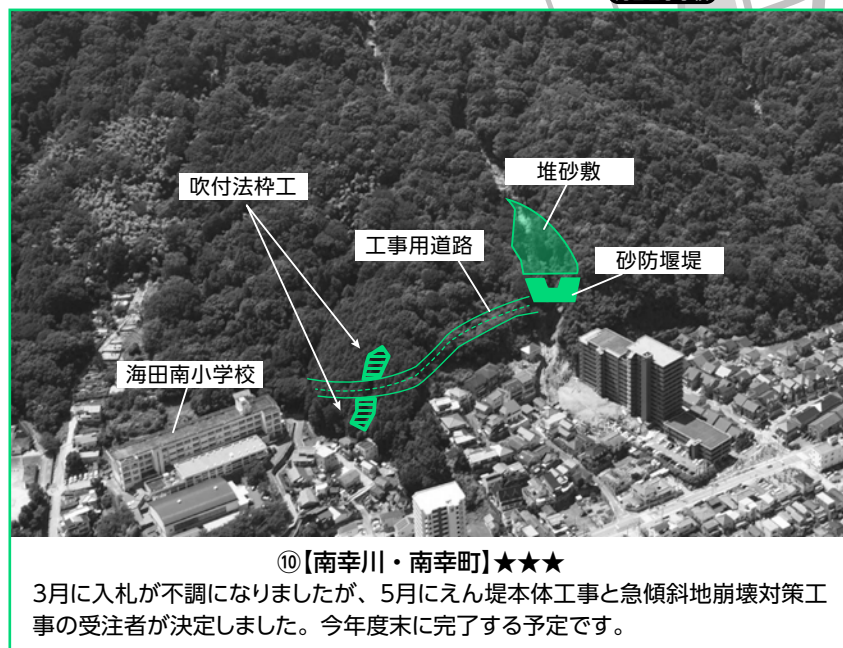

⑩【南幸川・南幸町】★★★★
3月に入札が不調になりましたが、5月にえん堤本体工事と急傾斜地崩壊対策工事の受注者が決定しました。今年度末に完了する予定です。




⑨【明飛川】★★★★
土砂の撤去、大型土のうの設置が完了しました。現在、えん堤整備に向けて、調査業務を実施中です。




④【唐谷川】★★★★
道路・護岸の工事については、5月に着手し、2カ年で工事を行う予定です。




⑥【三迫川左支川】★★★★
えん堤に堆積した土砂の撤去については、今年度中に完了を予定しています。護岸工事については、5月末に入札を行い、2カ年で工事を行う予定です。

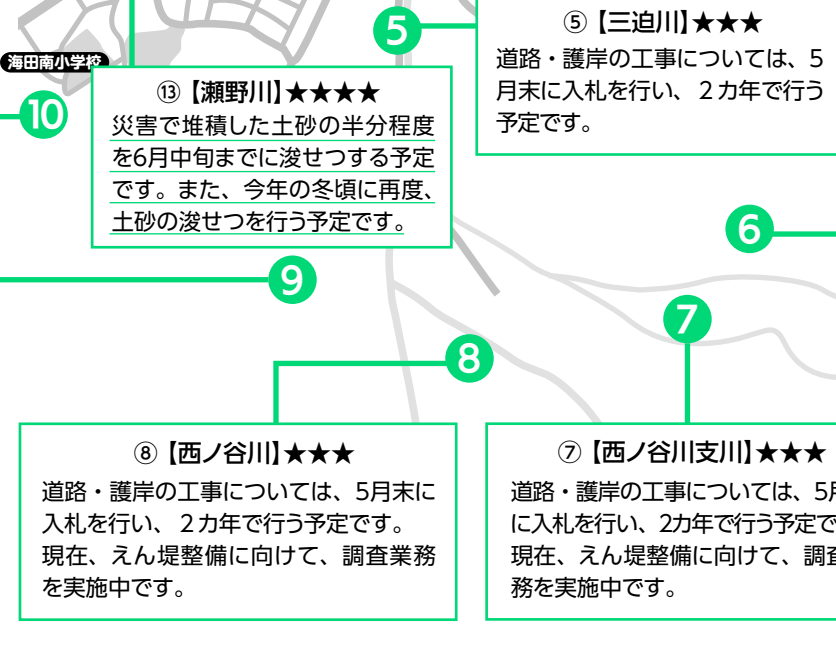


⑤【三迫川】★★★★
道路・護岸の工事については、5月末に入札を行い、2カ年で工事を行う予定です。



⑧【西ノ谷川】★★★★
道路・護岸の工事については、5月末に入札を行い、2カ年で工事を行う予定です。現在、えん堤整備に向けて、調査業務を実施中です。



⑦【西ノ谷川支川】★★★★
道路・護岸の工事については、5月末に入札を行い、2カ年で工事を行う予定です。現在、えん堤整備に向けて、調査業務を実施中です。

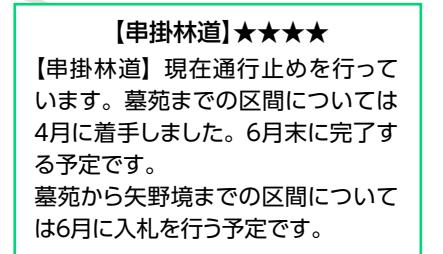

【串掛林道】★★★★
【串掛林道】現在通行止めを行っています。墓苑までの区間については4月に着手しました。6月末に完了する予定です。墓苑から矢野境までの区間については6月に入札を行う予定です。
